

Prosjektplan

Grenseløse muligheter - nytt biblioteksystem

Gjelder for perioden 01.01.2022 til 30.11.2023

Innhold

Bakgrunn	3
Forankring	3
Målsetting.....	3
Delmål:	3
Prosjektet og måloppnåelse knytta til FNs bærekraftmål.....	4
Omfang.....	4
Arbeidsområder i prosjektet	4
Metodikk	4
Organisering	5
Styringsgruppe.....	5
Prosjektgruppe	5
Prosjektfaser.....	6
Aktivitetsplan.....	6
HA 1: Etablering av prosjekt	6
HA 2: Innhente innspill fra aktørene	6
HA 3: Utarbeide kravspesifikasjon	6
HA 4: Anbudsprosess og innkjøp av system	7
HA 5: Innføring av nytt system	7
Milepæler	7
Budsjett og finansieringsplan	7

Bakgrunn

I Troms og Finnmark må de fleste bibliotekene bytte biblioteksystem når Mikromarc fases ut. Dette gir oss en mulighet til å tenke nytt. I Troms og Finnmark er det mange bibliotek, mange med små ressurser. Bibliotekene skal sammen finne ut om et nytt biblioteksystem kan gi gode måter å samarbeide på, dele på arbeid eller nye måter å organisere sine tjenester. Vi vil avklare om nytt biblioteksystem kan være felles for alle kommunene, og hvordan biblioteksystemet kan understøtte samarbeid. Hvilke merverdier kan vi få ut av biblioteksystemet ved å samarbeide mer?

Vi ser prosjektet i sammenheng med prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0, som også vil bygge opp under behov for samhandling og formidling av digitale kunnskapsressurser. Vi ser prosjektet i sammenheng med fylkesbibliotekenes fellesprosjekt om formidlingskompetanse. Det vil bidra til å avklare hva det nye systemet skal bidra med i formidlingsarbeidet. Vi ser prosjektet i sammenheng med vår deltakelse i Deichman sitt prosjekt Tjenesteplattform for norske bibliotek der vi er samarbeidspart.

Vi ønsker å finne muligheter for samarbeid på tvers av bibliotektyper som folkebibliotek, kombinasjonsbibliotek og bibliotek i videregående skoler, på tvers av kommunegrenser og gamle fylkesgrenser.

Forankring

Arbeidet sees i lys av Nasjonal bibliotekstrategis kapittel 5 om samarbeid og utvikling, Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 og Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 fra Finnmark.

Søknaden forankres i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 strategi for samhandling. Bibliotekene skal blant annet utvikle regional samhandling om bibliotek tjenester, stimulere til utvikling av de regionale biblioteksamarbeidene, utvikle felles standard for tjenestenivå, videreutvikle og evaluere litteraturforsyning for folkebibliotekene i Troms, øke tilgangen til e-bøker og andre digitale ressurser og stimulere til fellesskap rundt samlingsutvikling.

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 fra Finnmark har som tiltak å utrede muligheten for felles biblioteksystem for alle bibliotek og videreføre regionale biblioteksamarbeid.

På biblioteksjefsmøtet i april 2020 ble fylkesbiblioteket oppfordret av kommunene til å koordinere anskaffelse av nytt system. I forkant av prosjektsøknaden har fylkesbiblioteket arrangert innspillsmøte med folkebibliotek, kombinasjonsbibliotek og bibliotek i den videregående skolen.

Målsetting

Det overordna målet er bedre bibliotek tjenester i Troms og Finnmark.

Målet med prosjektet er å anskaffe og implementere et nytt biblioteksystem for bibliotekene i fylket.

Delmål:

- Biblioteksystemet skal tilrettelegge for nye samarbeid for eksempel når det gjelder formidling, kompetansedeling og kompetanseutvikling
- Mer sømløse bibliotek tjenester på tvers av bibliotektype og kommunegrenser.
- Bedre formidling og utnytting av felles digitale ressurser.
- Redusert tid brukt på rutineoppgaver
- Mer aktiv formidling av litteratur på minoritetsspråk som samisk, kvensk, finsk og russisk.

Prosjektet og måloppnåelse knytta til FNs bærekraftsmål

4: God utdanning. Kan samarbeid gi bedre utdanning i grunnskolen, høyere utdanning og innen livslang læring?

10: Mindre ulikhet. Kan samarbeid være med på å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i fylket?

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Kan samarbeid styrke samhandling mellom små og store enheter, særlig med tanke på med tanke på kompetansedeling fra større fagmiljøer til mindre enheter?

Omfang

Prosjektet går fra 1.1.2022 til 30.11.2023.

Prosjektet kan inkludere alle folkebibliotek og skolebibliotek vgs i Troms og Finnmark. I tillegg vil skolebibliotek i grunnskole også ha mulighet til å kjøpe samme biblioteksystem.

Arbeidsområder i prosjektet

Formidling: Folkebibliotekene i fylket samarbeider allerede om innkjøp av e-bøker, og har mange felles digitale ressurser i regi av fylkesbiblioteket. Hvordan kan disse formidles og utnyttes bedre i biblioteksystemet?

Internt arbeid: Er det mulig å redusere tiden bibliotekansatte bruker på f.eks. katalogisering og registrering av bøker, og dermed frigjøre mer tid til brukerfokuserete oppgaver?

Minoritetsspråk: Troms og Finnmark fylke har et spesielt ansvar for samiske og kvensk språk, har nasjonalt ansvar for finsk bibliotekjeneste, og bevilger midler til russisk bibliotekjeneste. Fylkeskommunen har formalisert samarbeid med Sametinget og fylkesbiblioteket inngår i Sametingets arbeid med formidling av samisk litteratur. Hvordan kan biblioteksystemet bidra til enda mer aktiv formidling av denne litteraturen?

Felles biblioteksystem: Mange av kommunene og skolene må ha nytt biblioteksystem, er det muligheter for felles biblioteksystem for alle kommunene og skolene?

Vi skal arrangere kurs og annen kompetanseheving slik at alle bibliotekansatte kan systemet godt.

Metodikk

Finnmark fylkesbibliotek var en av partene i prosjektet Biblioteket som samskaper. Kurset Startpakke for samskaping på bibliotekutvikling.no gir en god innføring i mange metoder for bedre gjennomføring av samarbeid, idémyldring og møter. For å sikre brukerperspektivet ønsker vi å bruke metoder fra samskaping til å gjennomføre aktiviteter med innbyggere i to-tre kommuner. Vi vil også bruke flere av metodene i møter med bibliotekene. Bibliotekene vil få praktisk erfaring med metodene, noe som kan føre til samskaping i egen kommune senere.

Organisering

Prosjekteier er fylkesbibliotek i Troms og Finnmark. Disse har søkt etter midler og rapporterer til Nasjonalbiblioteket. Troms og Finnmark er nå delt administrativt. Begge organisasjoner er likevel prosjekteier, og har lik påvirkning på prosjektet.

Styringsgruppe

Styringsgruppa har det overordna ansvaret. De skal følge opp progresjonen i prosjektet, de ser til at man holder seg innafor satte rammer og at man jobber mot prosjektets mål.

Styringsgruppa består av:

- Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek
- Sunniva Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek
- Liv Kristin Hansen, Kvæfjord bibliotek
- Elisabeth Klogh Hegge, utdanning Finnmark
- Lise Robertsen, utdanning Troms

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa er den som setter seg inn i ulike problemstillinger og som innstiller overfor styringsgruppa.


Prosjektgruppa består av

- Hilde Melhuus Lorentzen, Vadsø bibliotek
- David Wulff Sæther, Senja bibliotek
- Anja Borg Andreassen, Tromsø bibliotek
- Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
- Wenche Vevik, Båtsfjord bibliotek
- Elise Thomassen skolebibliotek Lakselv vgs
- Marte Serine Langstrand, skolebibliotek Stangnes vgs

Prosjektleder: Sigrid Stangnes

Øvrig prosjektteam: Trine Mellem og Mona Fonnes.

Prosjektfaser

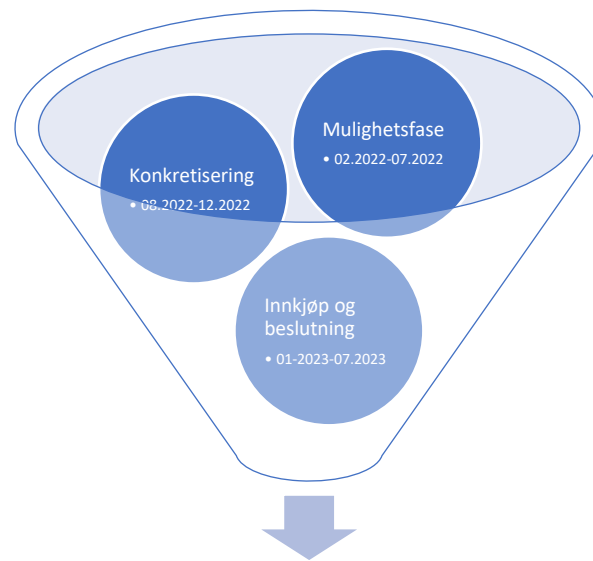

Nytt biblioteksystem

Prosjektet består av ulike faser, som sammen skal lede fram til innkjøp av nytt biblioteksystem. Prosjektets første år brukes til kartlegging av muligheter nye biblioteksystemer kan gi, og avklare hvilke behov vi vil at et nytt system skal innfri. Vi skal også utarbeide kravspesifikasjon. I det andre året henter vi inn tilbud og lager avtale om nytt biblioteksystem, implementerer nytt system, og gjennomfører kompetanseheving, som kurs og opplæring.

Aktivitetsplan

Under er prosjektets framdrift beskrevet i ulike aktiviteter. I tillegg vil det utarbeides en detaljert aktivitetsplan for hvert halvår.

HA 1: Etablering av prosjekt

Få på plass en prosjektleder, etablere styringsgruppe og prosjektgruppe. Utarbeide en ferdig prosjektplan. Få på plass en egen epostliste med de som skal motta informasjon om prosjektet.

Tid: 01.01.2022-01.03.2022

HA 2: Innhente innspill fra aktørene

Gjennom ulike møter med folkebibliotek og skolebibliotek vgs få innspill på hva som er viktig med tanke på nytt biblioteksystem og hvordan dette kan gi gevinster for bibliotekene. Det er også aktuelt å bruke felles biblioteksjefmøte og fagforum for skolebibliotek vgs til dette.

Tid: 01.03.2022-01.07.2022

HA 3: Utarbeide kravspesifikasjon

På bakgrunn av innspill så utarbeides det en kravspesifikasjon som gjenspeiler de ønsker og behov som bibliotekene har. Det er viktig at denne utarbeides ihht de krav som en innkjøpsprosess krever. I denne prosessen kan det bli aktuelt med innspillsmøte med leverandørene.

Tid: 01.07.2022-31.12.2022

HA 4: Anbudsprosess og innkjøp av system

Den ferdige utarbeida kravspesifikasjonen legges til grunn for anbudsprosessen. Denne prosessen må sikre at det beste biblioteksystemet blir innkjøpt. Det er mange formelle forhold som må være innfridd. Det vil være aktuelt å gjennomføre brukertesting.

Tid: 01.01.2023-01.07.2023

HA 5: Innføring av nytt system

Etter innkjøp skal systemet innføres i bibliotekene. Dette vil kreve en del støtte, samt kursing ol.

Tid: 01.07.2023-30.11.2023

Milepæler

MP1: Avklart hvilke bibliotek som er ønsker å delta på fellesinnkjøp.

MP 2: Kravspesifikasjon er ferdig utarbeidet og vedtatt.

MP 3: Valg av leverandør er foretatt.

Budsjett og finansieringsplan

Utgifter

	År 1	År 2
Lønn	kr 635 000	kr 635 000
Frikjøp prosjektgruppe	kr 100 000	kr 100 000
Reiser	kr 230 000	kr 140 000
Møteutgifter	kr 30 000	kr 30 000
Kompetanseheving	kr 40 000	kr 130 000
Arbeidstid	kr 300 000	kr 300 000
Kontor og adm	kr 60 000	kr 60 000
Totalt	kr 1 395 000	kr 1 395 000

Inntekter

Nasjonalbiblioteket	kr 400 000	kr 400 000
Egenandel	kr 635 000	kr 635 000
Egenandel arbeidstid	kr 300 000	kr 300 000
Egenandel kontor og adm	kr 60 000	kr 60 000
Totalt	kr 1 395 000	kr 1 395 000
